

西部市民サービスセンター空調設備更新工事 空調設備更新工事のお知らせ

館内の空調設備更新工事に伴い、下記日程で館内各所に作業エリアを設けます。期間中は、通路幅の一部制限、作業音、作業員・資材の出入り等が発生する場合があります。
安全確保のため、カラーコーン・バリケードで区画した範囲内には立ち入らないようお願いいたします。

予定日	作業対象エリア	利用者の皆様への影響・お願い
9/28(月) ～ 9/30(水)	1 階 多目的ホール（半面）	ステージ側の半面が空調工事の為、ご利用できません。
9/30(水) ～ 10/1(木)	1 階 大気観測室	
10/5(月) ～ 11/6(金)	空調停止期間	館内空調が停止する予定です。気温に応じた服装でのご来館にご協力ください。
10/6(火) 夜間 10/7(水) 夜間	屋上機器の撤去・搬入作業	夜間に屋外バスロータリー前にてクレーン作業を行います。作業区域には近づかないでください。
10/10(土) 10/12(月)	1 階 支所エリア	支所エリアは休日作業予定です。
10/12(月)	1 階 ホール・地域活動室・バス待合室	ホール内の数か所に作業用の足場を設置しますが、カラーコーン等で区画し安全通路を確保します。
10/13(火)	1 階 守衛室	守衛業務に影響がないよう作業スペースを確保して行う。（平日16時まで）
10/14(水) ～ 10/23(金)	2 階 一部室内作業	各室の利用状況を確認しながら作業します。作業エリアを区画し、安全通路を確保して施工します。
10/26(月) ～ 10/29(木)	3 階 一部室内作業	各室の利用状況を確認しながら作業します。作業エリアを区画し、安全通路を確保して施工します。
10/26(月) ～ 10/30(金)	1 階 多目的ホール（半面）	空調設置工事の為、ステージ側半面のご利用はできません。
11/2(月) ～ 11/6(金)	屋上・守衛室・他	試運転調整作業を行います。11/7（土）より空調復旧予定です。


安全確保のためのお願い
・立入禁止区画、カラーコーン、バリケード内には入らないでください。
・小さなお子さまをお連れの方は、作業エリア付近で目を離さないようお願いいたします。
・作業員・誘導員・施設職員の案内がある場合は、その指示に従ってください。
・ホール、廊下付近では、利用者動線に十分配慮して作業します。

特にご確認ください
※施工予定日は、施設利用予定および施設管理者との協議により変更する場合があります。
※子育て交流ひろばおよび授乳室の施工は、原則17:00以降に行う予定です。
※詳しい作業範囲は、次ページの「工事予定エリア図」をご確認ください。

西部市民サービスセンター空調設備更新工事
工事予定エリア図


※下図の着色部が主な作業予定エリアです。実際の施工時は、現地にカラーコーン・バー等で作業区画を設け、安全通路を確保します。

1 階平面図

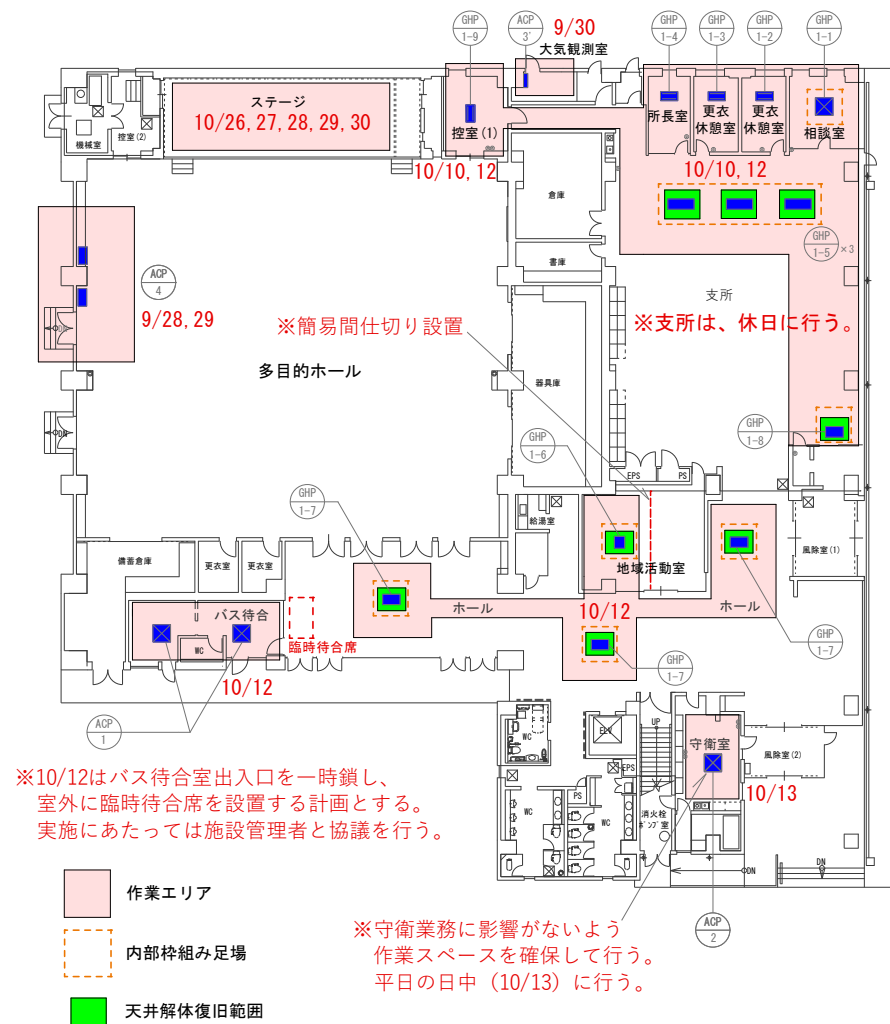


2階平面図

※廊下施工時、カラーコーン/バーで安全通路を確保し、
利用者の移動に支障がないよう安全に配慮しながら行う。

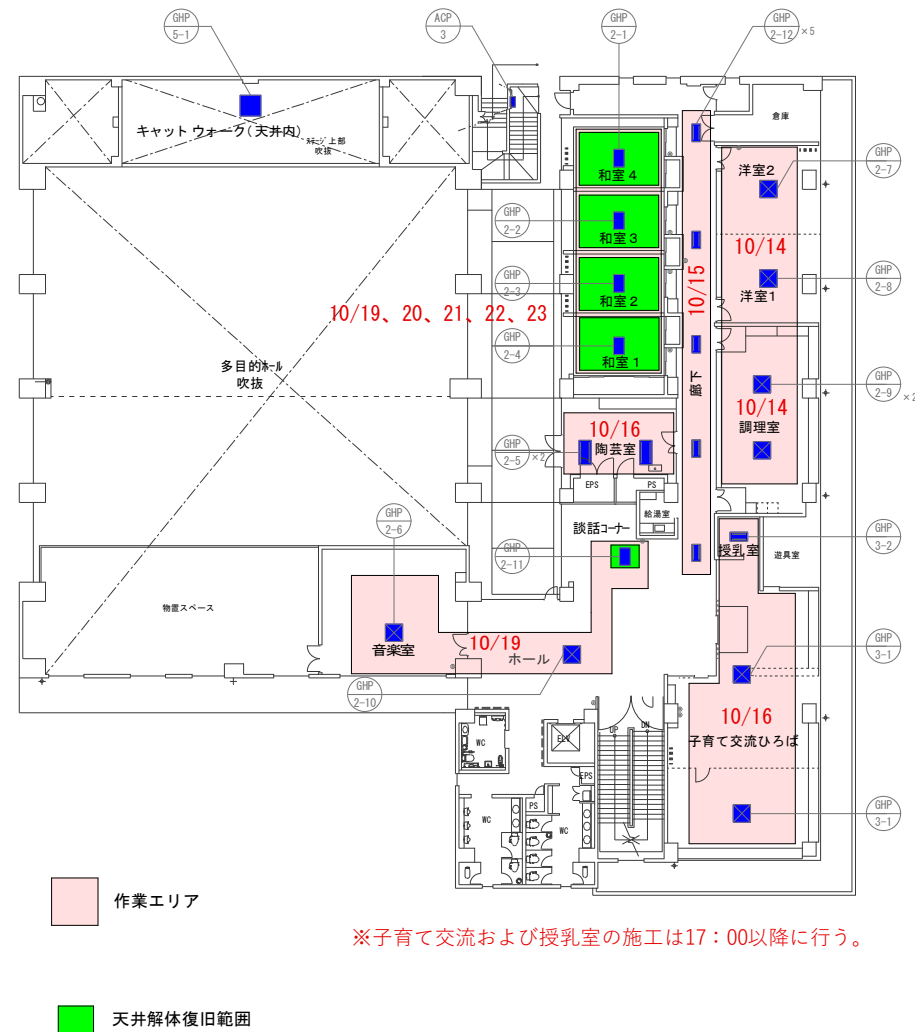

3 階平面図

10/6（夜間）にて撤去
10/7（夜間）にて搬入
※屋上への移動は外部足場を利用します。
（別紙保安計画図参照）

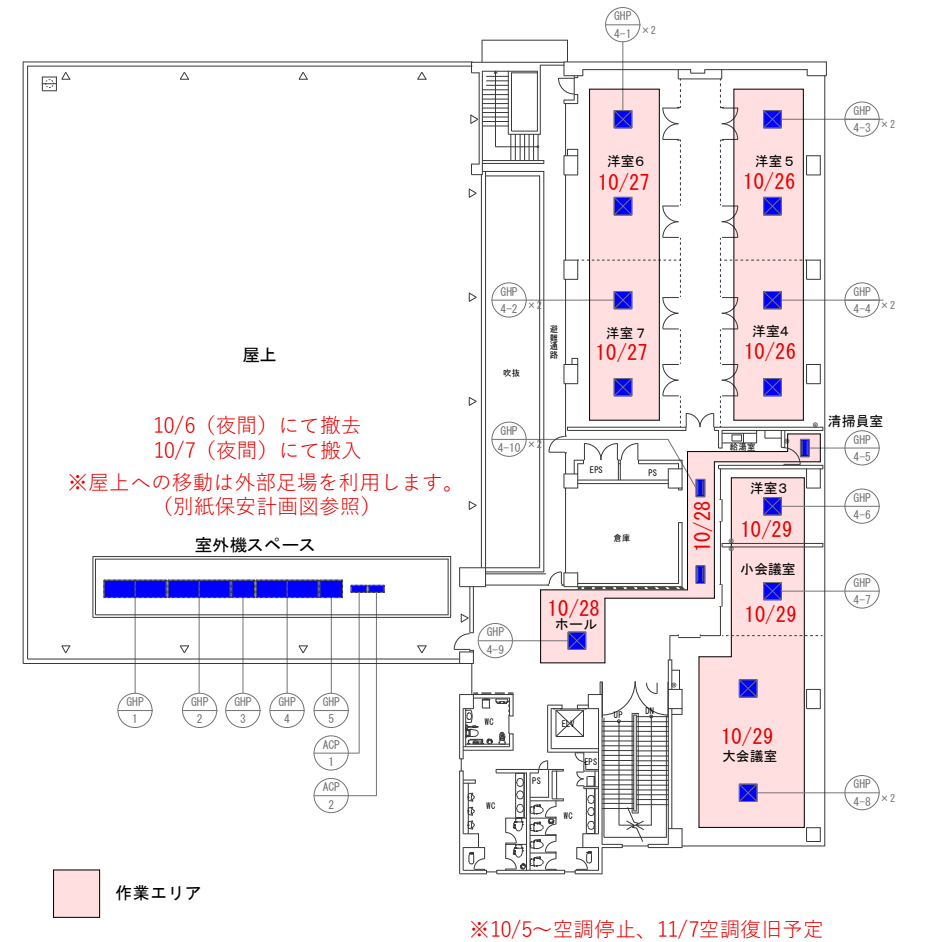


凡例	ピンク着色：作業エリア／橙破線：内部枠組み足場設置・区画予定／青表示：空調機器（更新）
共通事項	作業エリアはカラーコーン・バー等で区画し、安全通路を確保します。屋上作業は外部足場を利用し別紙保安計画図により管理します。

10/6(火)～10/7(水)


夜間クレーン揚重作業 保安計画図

19:40～作業終了まで：外部立入防止＋館内利用者のロータリー方面誤進入防止

1階平面図

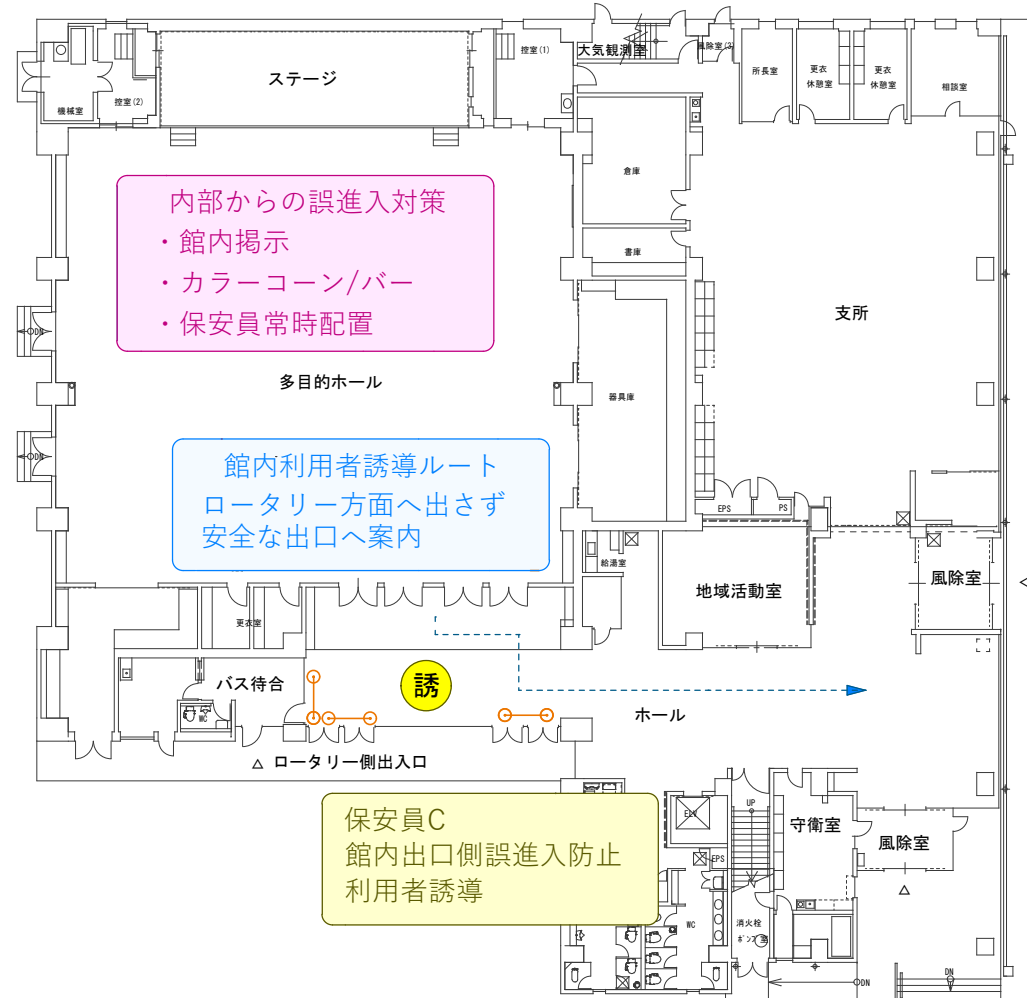

外部クレーン配置図

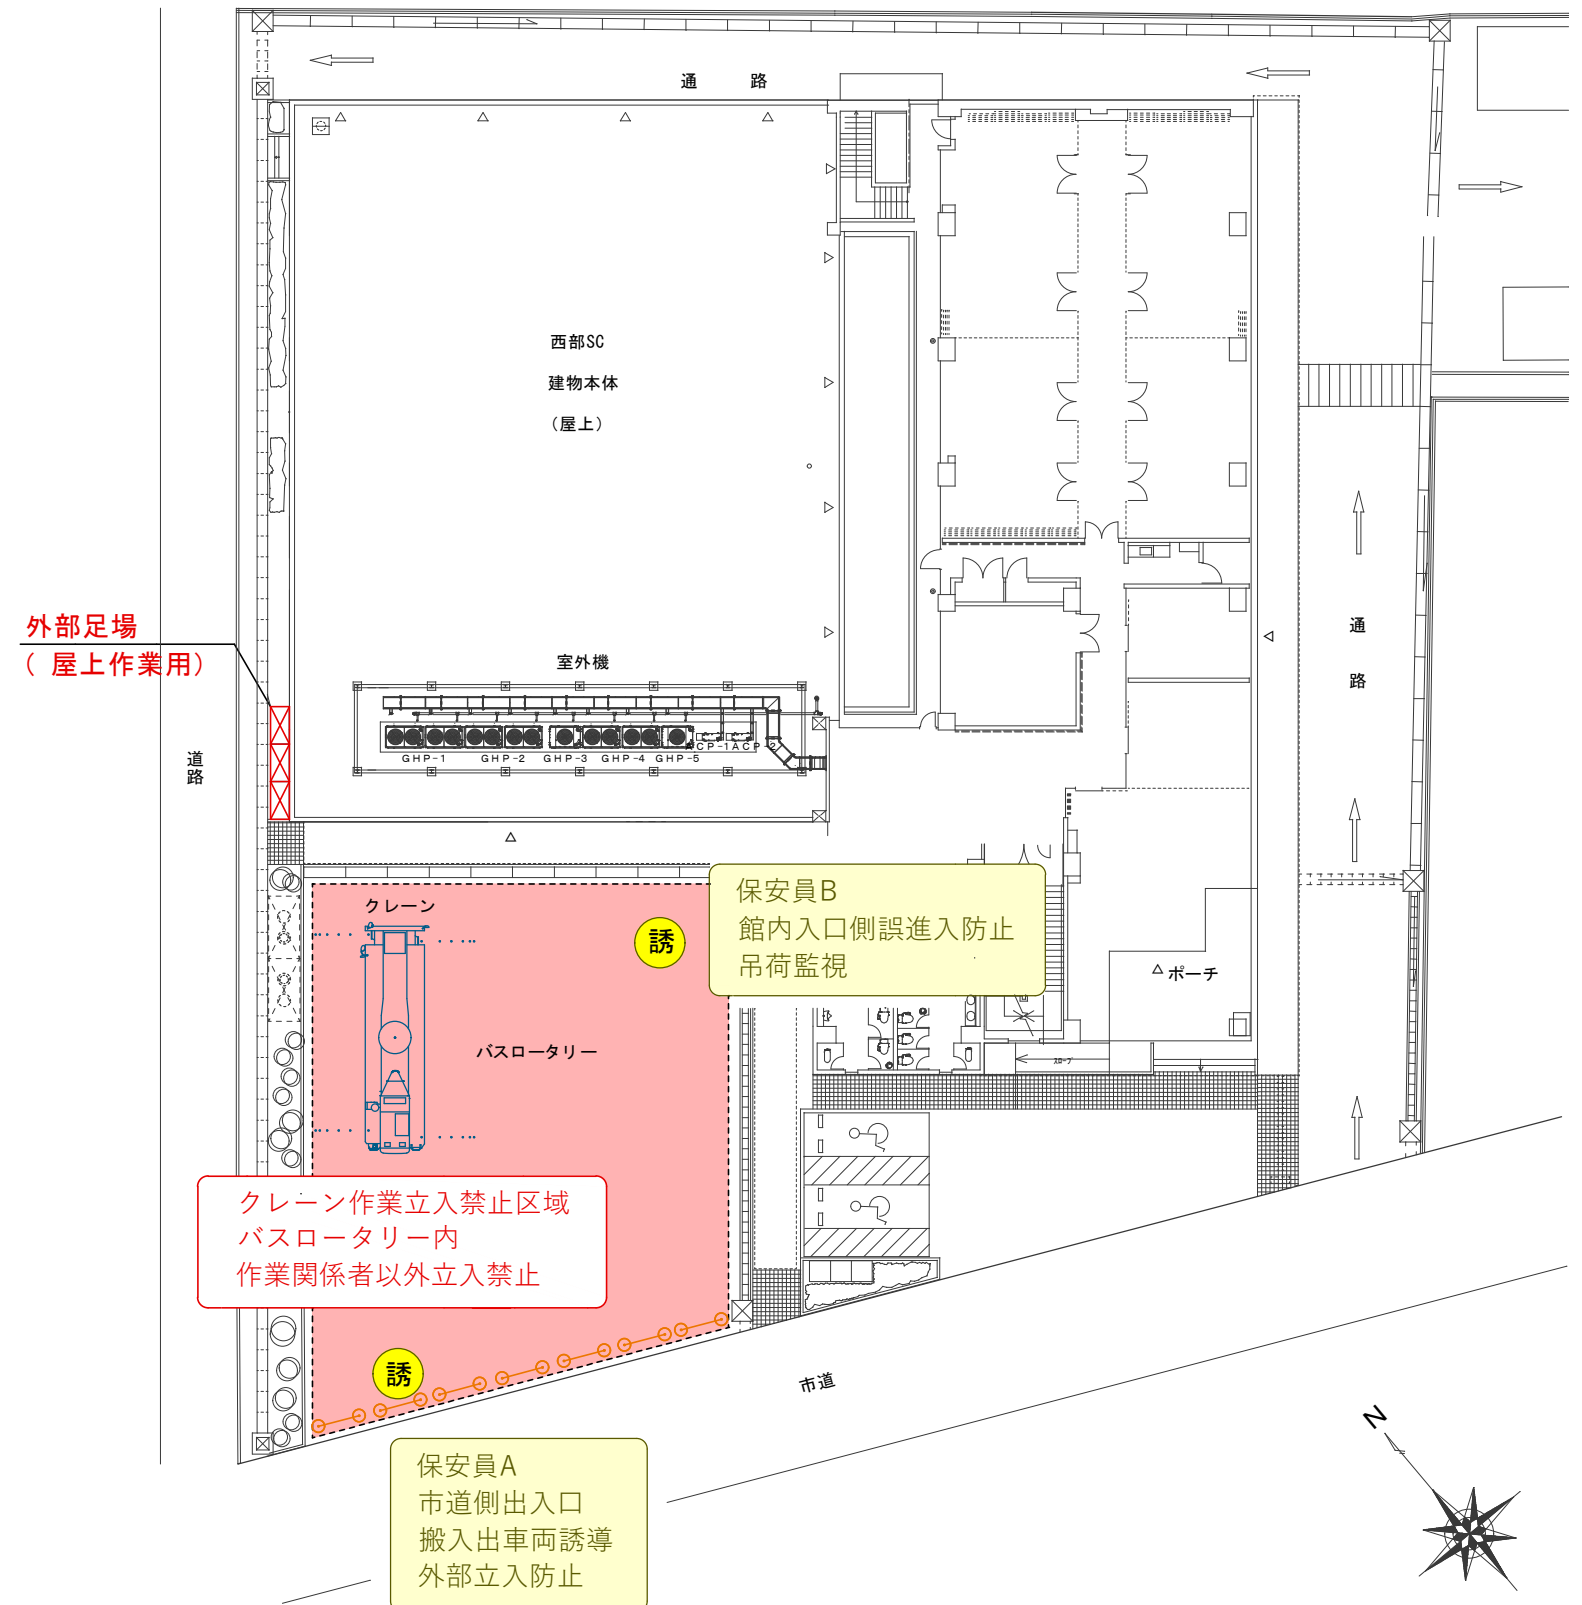

凡例

- 立入禁止・クレーン作業区域
- 利用者誘導ルート・安全通路
- 誘 保安員・誘導員配置
- 通行止め・カラーコーン

注意事項：利用者誤進入・第三者接近時は直ちに作業を一時中止する。

保安管理手順

- ①. 19:40頃：館内ロータリー側出口を封鎖
- ②. 19:55頃：照明・カラーコーン設置、クレーン入場
- ③. 20:05頃：誘導員・玉掛・合図者配置完了
- ④. 20:10頃：揚重作業開始
- ⑤. 22:30頃：片付け・揚重作業終了
