



古川雨水排水ポンプ場工事だより



発注者：秋田市上下水道局 担当：下水道整備課 下水道整備第二係 018-864-1455

令和6年10月号



各工事の進捗状況 及び お知らせ

建設工事：引込施設・ポンプ場（基礎・躯体）・吐出水槽・乗り越し管
熊谷・山岡・秋田舗道建設工事共同企業体
工期：令和6年1月29日～令和8年3月23日



引込施設全景(土留工事着手前)



ポンプ場全景(土留工事)

連絡先：現場代理人 鈴木 駿
事務所：018-838-5493


コメント

ポンプ場では、土留工事(鋼矢板打込み)を終えた後に、土留内部の掘削作業を行っております(一次掘削：深さ2m※)。

引込施設においても、掘削作業に先立って土留工事(鋼矢板打込み)を行っております。

※ポンプ場掘削深さ：(地上からの深さ)

①一次掘削：2.0m ②二次掘削：5.8m ③最終掘削：9.1m



工事のお知らせ

○**ポンプ場**：9月より引き続き**土留内部の掘削作業**を行います。掘削で発生した土砂を場外へ搬出するため、**終日大型ダンプトラックの通行があります**。その後、掘削完了の4分の1程度まで掘り終えたら、地山の崩壊を防ぐため、土留鋼矢板を鋼材で補強する工事(切梁・腹起し設置)を行います。

○**引込施設**：ポンプ場と同じように、**土留工事(鋼矢板打込み)**を行います。

○**ポンプ場、引込施設**では、ダンプトラックや鋼材搬入のための**大型車両の通行**があります。ご迷惑をおかけしますが引き続きご協力をお願いいたします。

裏面につづく

公共下水道築造工事：導水渠

山岡・加賀屋・石黒建設特定建設工事共同企業体

工期：令和6年1月12日～令和7年3月21日

連絡先：現場代理人 高橋 浩樹

事務所：018-826-1616



コメント

先月で1工区のボックスカルバート（幅 2.8m×高 2.8m）の据付作業が終了し、今月は埋戻し（RC-40・改良土）を行いながら铸铁管100mmを布設後、土留工の鋼矢板の引抜きを行っていきます。
相変わらず、湧水量が多く24時間排水を行っております。ご迷惑をお掛けしますがご協力をお願い致します。

工事のお知らせ

ボックスカルバートの埋戻しを行い、終了しだいに土留工の鋼矢板の引抜き作業を行っていきます。
大型車両で埋戻し材料の搬入等(1日8～10台を予定)を行います。ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。

機械設備工事：

西島・山岡・秋田東北建設工事共同企業体


工期：令和6年3月18日～令和8年3月23日

連絡先：現場代理人 菊池 圭紘

事務所：022-223-3971

コメント

現在、主ポンプ設備及びゲート・除塵機設備の製作図の作成中になります。
現場工事は、令和7年度から予定しております。

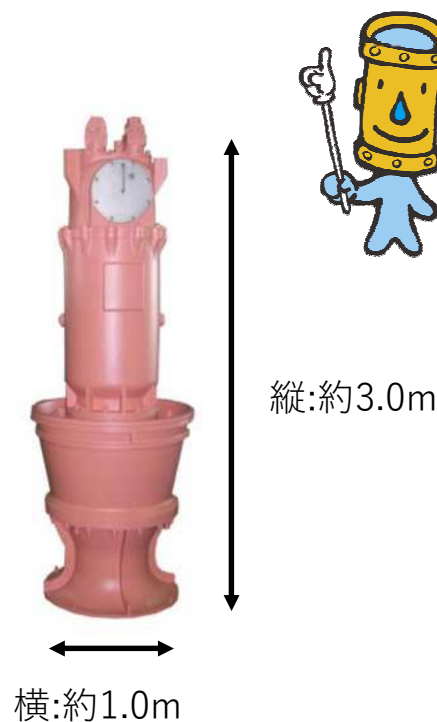

コラム型水中ポンプ（イメージ図）
主ポンプ（雨水排水）を
8台設置します。

電気設備工事：

本荘電気・松澤電気・ライトン特定建設工事共同企業体

工期：令和6年6月7日～令和8年3月23日

連絡先：現場代理人 渡邊 淳

事務所：018-823-7281

コメント

現在、自家発電設備及び受変電設備機器製作図の作成中になります。
現場工事は、令和7年度から予定しております。



ガスタービン発電機（イメージ図）
主ポンプ運転用として
発電出力1250kVAを2台設置します

