



古川雨水排水ポンプ場工事だより



発注者：秋田市上下水道局 担当：下水道整備課 下水道整備第二係 018-864-1455

令和8年2月号



各工事の進捗状況 及び お知らせ

建設工事：引込施設・ポンプ場（基礎・躯体）・吐出水槽・乗り越し管


熊谷・山岡・秋田舗道建設工事共同企業体

工期：令和6年1月29日～令和9年3月24日

連絡先：現場代理人 松本 佳人

事務所：018-838-5493

ポンプ棟/ポンプ井・水路 スクリーン棟/着水槽・スクリーン水路・沈砂池躯体構築

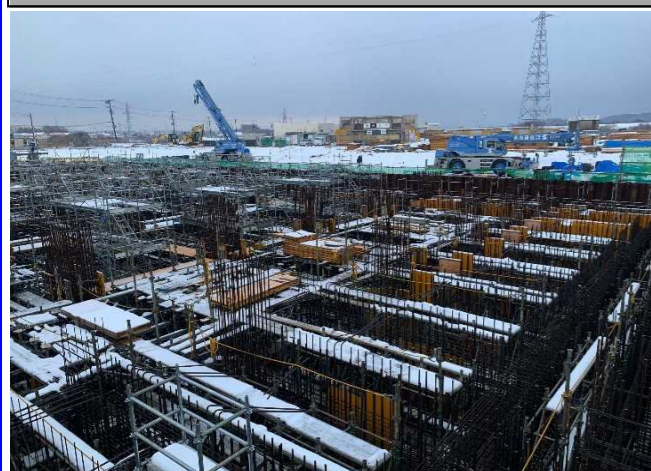

ポンプ井方向
梁鉄筋型枠組
立工事中



沈砂池方向
梁鉄筋型枠組
立工事中



お知らせ
電光掲示板

ポンプ場は、底版上からの柱・壁躯体コンクリート工事を進めていきます。2月は後半に大量のコンクリートを打設する日が2回あります。引込施設では、接続水路の擁壁が完成しましたので、水路部分の根固めブロック工事を施工します。打設日は特に、コンクリートの搬入車両が多くなりますので、ポンプ場入口前の電光掲示板でご案内致します。引き続き工事車両の出入り等により、ご迷惑をおかけしますがご協力の程よろしくお願い致します。

引込施設
接続水路

接続水路
根固めブロッ
ク工事。



公共下水道築造工事：導水渠

山岡・加賀屋・石黒建設特定建設工事共同企業体

工期：令和6年1月12日～令和8年3月23日



連絡先：現場代理人 高橋 浩樹

事務所：018-826-1616



コメント

今月は引込施設、ポンプ場との導水渠の接続工事を行います。
布設完了後に埋戻し、土留の引抜、整地を行い、天候を見ながら
市道（砂利道）の復旧を行います。

河川敷整備工事：

秋田舗道株式会社

工期：令和7年8月29日～令和8年3月23日



連絡先：現場代理人 奈良 誠

事務所：018-862-4898



コメント

今月は積雪の状況を見て場内通路の舗装、張芝の施工を行います。


機械設備工事：

西島・山岡・秋田東北建設工事共同企業体

工期：令和6年3月18日～令和9年3月24日

連絡先：現場代理人 菊池 圭紘

事務所：022-223-3971



コメント

現在、排水ポンプの製作が完了し、残り
設備の製作をしております。
なお、現場の作業は、建設工事と調整し
ながらの実施を予定しております。

電気設備工事：


本荘電気・松澤電気・ライトン

特定建設工事共同企業体

工期：令和6年6月7日～令和9年3月24日

連絡先：現場代理人 渡邊 淳

事務所：018-823-7281



コメント

現在、ガスタービン発電機の製作が完了
し、残り設備の製作をしております。
なお、現場の作業は、建設工事と調整し
ながらの実施を予定しております。

護岸工事：

伊藤工業 株式会社

工期：令和7年4月1日～令和8年3月19日

連絡先：現場代理人 大友 朝陽

事務所：018-886-2135



コメント

今月から本格的な工事に着手し、作業ヤードの整
備、既設護岸の掘削等を行います。
