


令和 7 年11月定例会

建設委員会資料
(建設部)

古川排水機場整備の進捗状況について

1 概要

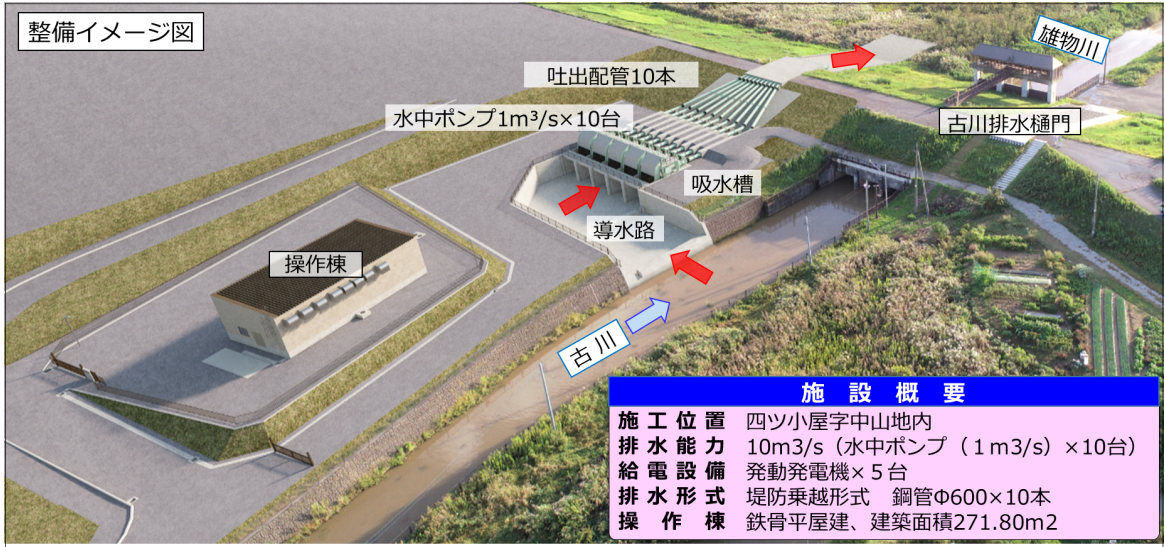

年度	R5	R6	R7	現在	R8
○古川排水機場本体整備工事 施工業者 伊藤工業・英明・加藤建設 特定建設工事共同企業体 工期 令和5年9月29日から 令和8年3月19日まで 契約金額 9億7,625万円(第1回変更)		基礎杭工 吸水槽、導水路 操作棟盛土	連絡道路 路盤 舗装		
○古川排水機場機電設備整備工事 施工業者 荏原・能登谷・秋田電機 建設工事共同企業体 工期 令和5年9月29日から 令和8年3月19日まで 契約金額 15億6,302万円(第3回変更)		ポンプ等工場製作	吐出配管、ポンプ、除塵機設置 発電機等設置		供用開始
○古川排水機場操作棟建築工事 施工業者 伊藤工業・加藤建設 特定建設工事共同企業体 工期 令和6年12月24日から 令和8年3月19日まで 契約金額 2億4,288万円			基礎杭工 操作棟建築 外構		

2 現在の施工状況



3 今後の予定

- (1) 本体整備工事において、週休二日制モデル工事の実施により、施工業者からの実績報告に基づき増工する。(令和8年2月定例会上册予定)
- (2) 操作棟建築工事において、施設の実運用の観点や隣接工事との調整により、電気設備や外構等の一部で変更が必要となったことから増工する。(専決処分により対応予定)

【変更予定箇所】

