

令和5年11月定例会

予算決算委員会資料
(環 境 部)

溶融施設大規模改修事業について

1 概要

令和5年7月の豪雨による災害ごみの処理を優先し、工事を延期したことに伴い経費のかかり増しに対応するため、継続費を増額するとともに、施工時期の見直しに伴い、令和5年度の事業費を減額する。

2 事業費

(単位：千円)

年度	区分	事業費	財源		主な工事対象機器
			特定財源	一般財源	
2	—	268,900	253,300	15,600	溶融炉耐火物 ほか
3	—	1,362,250	1,361,200	1,050	前処理破砕機 ほか
4	—	1,739,550	1,738,500	1,050	水砕水冷却塔 ほか
5	補正前	1,939,200	1,938,200	1,000	1号炉ボイラ耐火物
	補正後	1,842,466	1,813,000	29,466	1号炉燃焼室耐火物
	補正額	△96,734	△125,200	28,466	誘引通風機 ほか
6	補正前	—	—	—	<u>2号炉ボイラ耐火物</u>
	補正後	189,134	189,100	34	<u>2号炉燃焼室耐火物</u>
	補正額	189,134	189,100	34	
計	補正前	5,309,900	5,291,200	18,700	
	補正後	5,402,300	5,355,100	47,200	
	補正額	92,400	63,900	28,500	

3 スケジュール

年月	変更前	変更後
令和5年7月	2号炉耐火物工事施工 竣工	2号炉耐火物工事中止
12月		継続費補正
令和6年1月		変更仮契約
3月		変更本契約
7月		2号炉耐火物工事施工
9月		竣工

溶融施設大規模改修事業概要

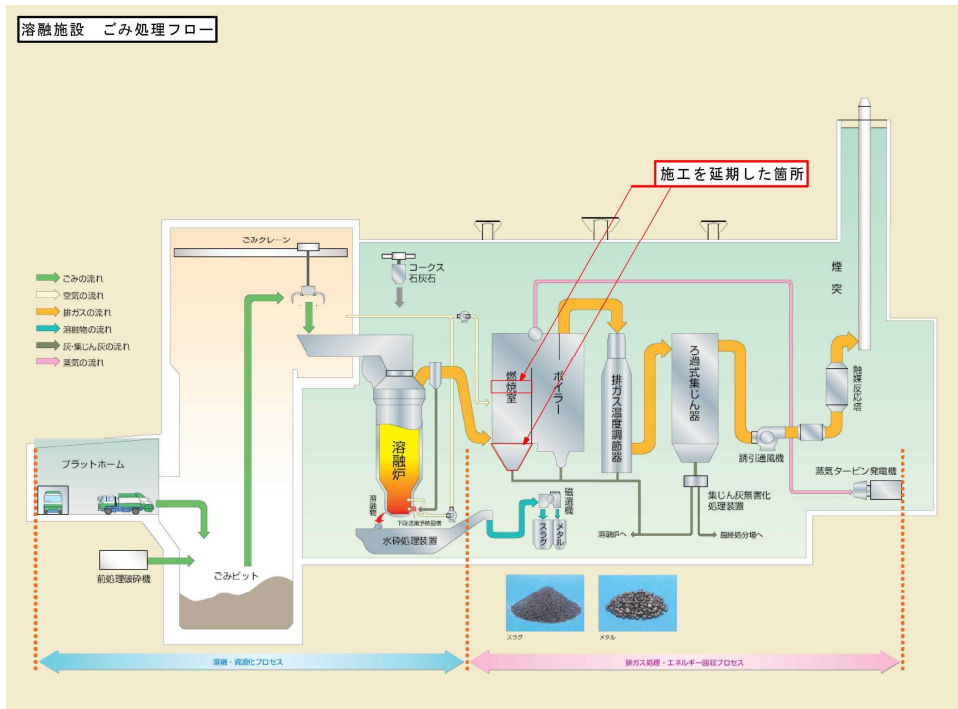


図1 ごみ処理全体フロー

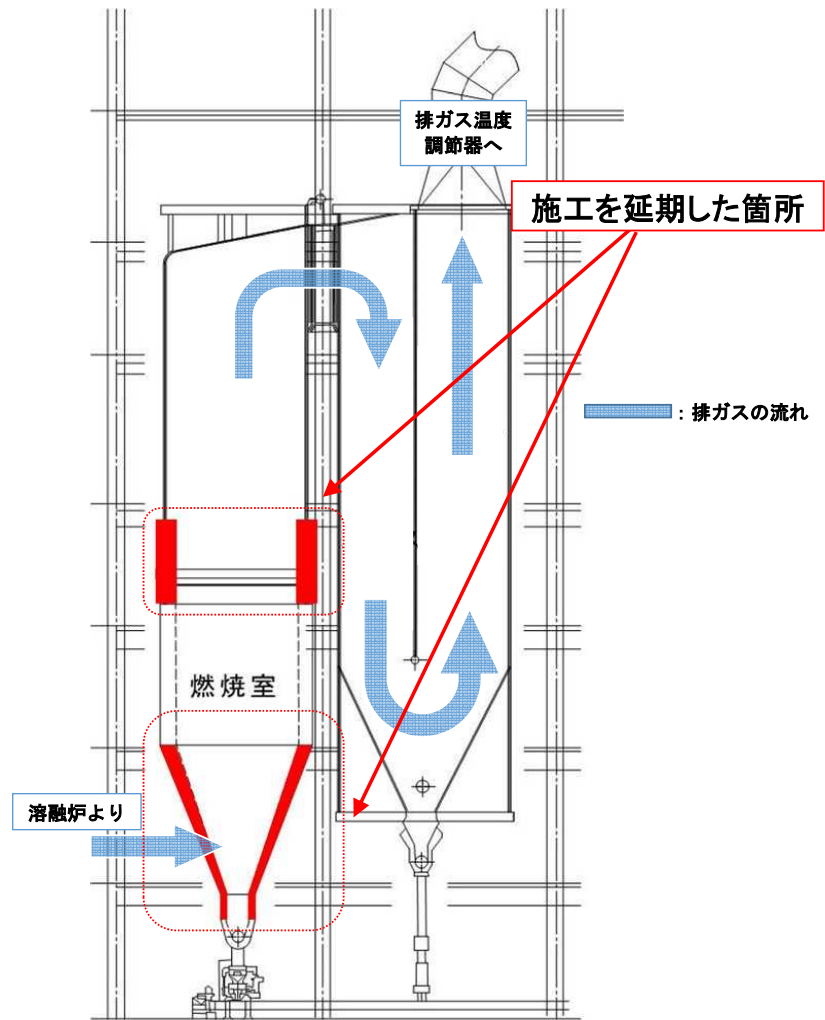


図2 燃焼室・ボイラー詳細



写真 品質保証期限切れの耐火物
