



# 古川雨水排水ポンプ場工事だより



発注者：秋田市上下水道局 担当：下水道整備課 下水道整備第二係 018-864-1455

令和7年2月号



## 各工事の進捗状況 及び お知らせ

建設工事：引込施設・ポンプ場（基礎・躯体）・吐出水槽・乗り越し管

熊谷・山岡・秋田舗道建設工事共同企業体


工期：令和6年1月29日～令和8年3月23日

連絡先：現場代理人 鈴木 駿

引込施設  
基礎コンクリート

乗り越し管  
護岸ブロック設置

事務所：018-838-5493

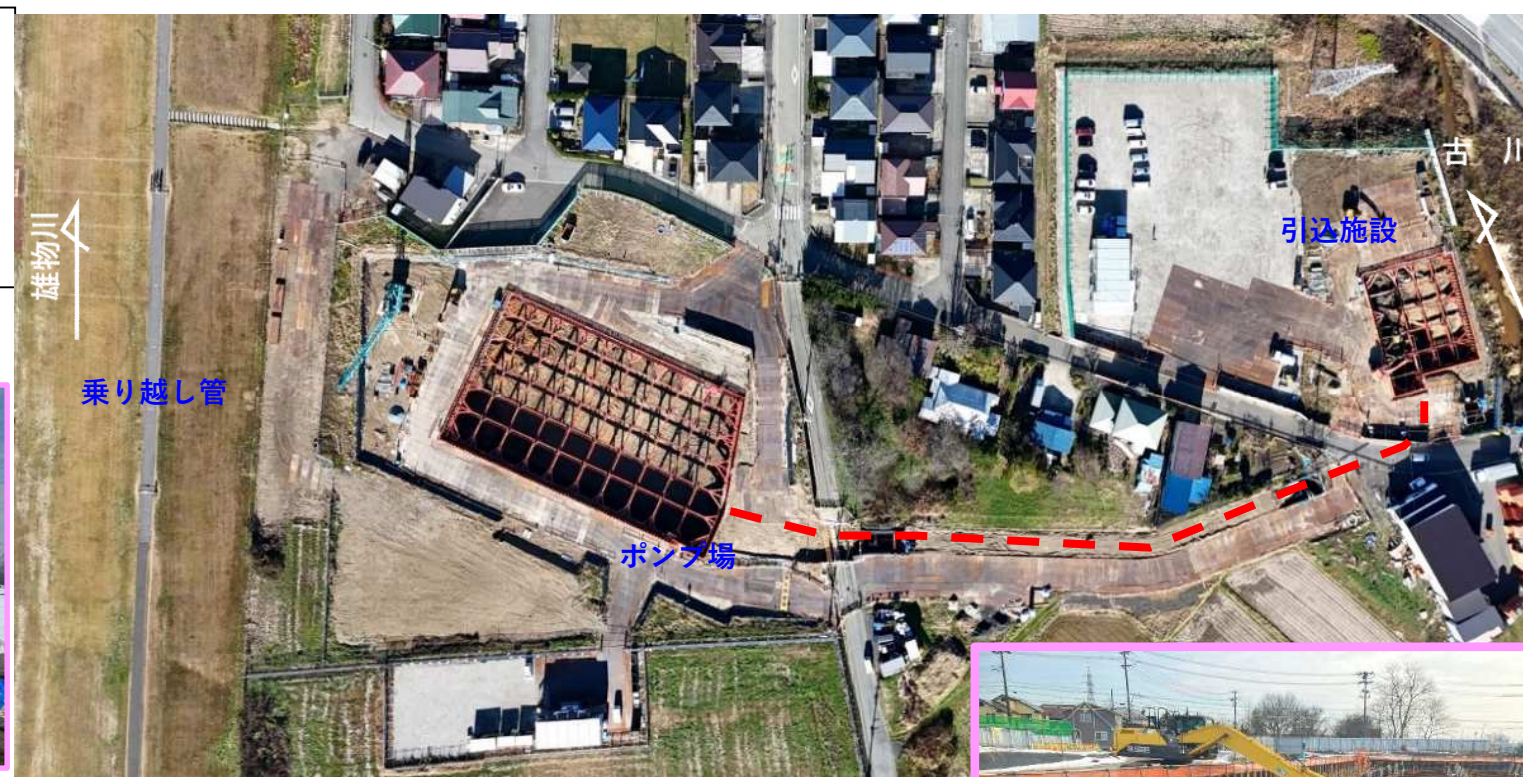

## コメント

各工事箇所において、引き続きダンプトラックや生コン車等、大型車両の通行を予定しております。2月はポンプ場コンクリート工事の実施に伴い、生コン車の通行が多くなります。ご迷惑をおかけしますがご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。



裏面につづく

公共下水道築造工事：導水渠

山岡・加賀屋・石黒建設特定建設工事共同企業体

工期：令和6年1月12日～令和7年3月21日


連絡先：現場代理人 高橋 浩樹

事務所：018-826-1616



## コメント

1月で、通行止めしている現道横断部分の補助地盤改良工(薬液注入)が終了して、今月は既設埋設管の防護を施しながら、管路土工(掘削・発生土処理)、管路土留工(腹起し・切梁設置)、管基礎工(砕石・コンクリート基礎)を行います。引き続き、24時間湧水処理を行っております。ご迷惑をお掛けしますがご協力をお願い致します。

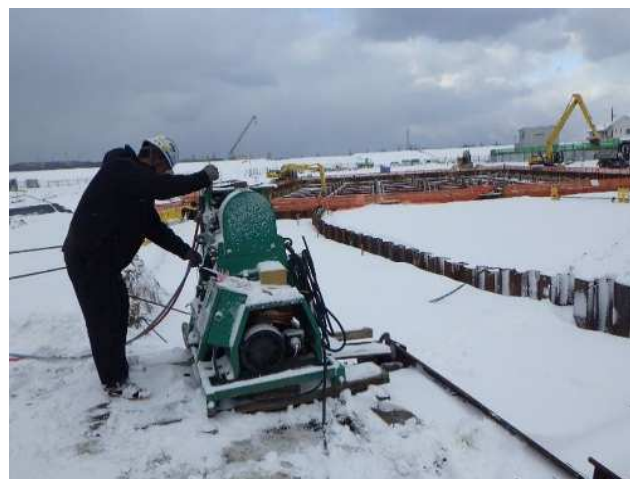

## 工事のお知らせ

現道部分の通行止めが続き、皆様には大変ご迷惑をおかけしておりますが早期の解除を目指し、引き続き安全に注意して作業にあたりますのでご協力をお願いします。

機械設備工事：

西島・山岡・秋田東北建設工事共同企業体

工期：令和6年3月18日～令和8年3月23日


連絡先：現場代理人 菊池 圭紘

事務所：022-223-3971

## コメント

現在、主ポンプ設備及びゲート・除塵機設備の製作図の作成中になります。現場工事は、令和7年度から予定しております。

## 機器紹介



縦:約8.0m

横:約3.0m

【自動除塵機 (イメージ図)】  
水路に流れてくるゴミ等を取り除く  
除塵機を4台設置します。

電気設備工事：

本荘電気・松澤電気・ライトン特定建設工事共同企業体


工期：令和6年6月7日～令和8年3月23日

連絡先：現場代理人 渡邊 淳

事務所：018-823-7281

## コメント

現在、自家発電設備及び受変電設備機器製作図の作成中になります。現場工事は、令和7年度から予定しております。



## 機器紹介



【モールド型変圧器 (イメージ図)】  
受変電設備機器の内、ガスタービン発電機から  
6600Vで送られてきた電気を420Vに下げる機器  
です。その後、主ポンプへ供給されます。
