



古川雨水排水ポンプ場工事だより



発注者：秋田市上下水道局 担当：下水道整備課 下水道整備第二係 018-864-1455


令和8年1月号



令和8年もよろしくお願いたします。良いお年を

各工事の進捗状況 及び お知らせ

建設工事：引込施設・ポンプ場（基礎・躯体）・吐出水槽・乗り越し管
熊谷・山岡・秋田舗道建設工事共同企業体 連絡先：現場代理人 松本 佳人
工期：令和6年1月29日～令和9年3月24日 事務所：018-838-5493
冬期休暇 12月28日～1月4日（除雪および緊急時は除く）

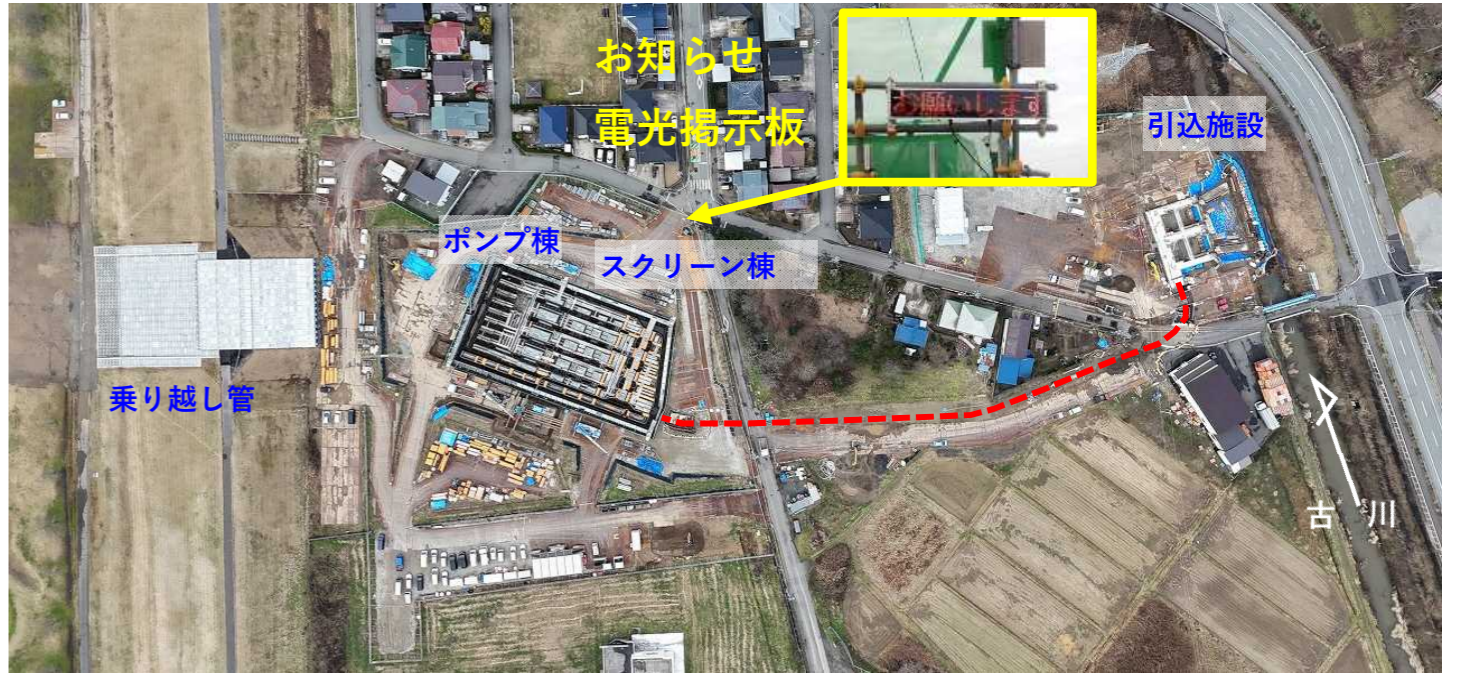

ポンプ場は、底版上からの柱・壁躯体コンクリート工事を進めていきます。大量の鉄筋・型枠材を組み立てる為、今月もポンプ場への資機材の搬入搬出車両が多くなります。引き続きポンプ場入り口前の電光掲示板でのご案内をいたします。

引込施設では、接続水路の基礎地盤の改良が終了しましたので、接続水路本体工事を継続します。



裏面につづく

公共下水道築造工事：導水渠

山岡・加賀屋・石黒建設特定建設工事共同企業体

工期：令和6年1月12日～令和8年3月23日

冬期休暇 12月30日～1月5日（除雪および緊急時は除く）



連絡先：現場代理人 高橋 浩樹

事務所：018-826-1616



コメント

市道横断部の施工を完了し、8月から実施していた仁助橋手前からの通行止めは終了しました。ご協力ありがとうございました。

年明けからは引込施設、ポンプ場との導水渠の接続工事を行います。

河川敷整備工事：

秋田舗道株式会社

工期：令和7年8月29日～令和8年3月23日

冬期休暇 12月30日～1月6日（除雪および緊急時は除く）



連絡先：現場代理人 奈良 誠

事務所：018-862-4898



コメント

河川敷内の掘削をほぼ完了し、堤防の敷鉄板等は撤去しました。ご協力ありがとうございました。

年明けからは張芝施工の準備を行います。

機械設備工事：

西島・山岡・秋田東北建設工事共同企業体

工期：令和6年3月18日～令和9年3月24日

冬期休暇 12月27日～1月4日

（除雪および緊急時は除く）

連絡先：現場代理人 菊池 圭紘

事務所：022-223-3971



コメント

現在、排水ポンプの製作が完了し、残り設備の製作をしております。

なお、現場の作業は、建設工事と調整しながらの実施を予定しております。

電気設備工事：

本荘電気・松澤電気・ライトン

特定建設工事共同企業体

工期：令和6年6月7日～令和9年3月24日

冬期休暇 12月27日～1月4日

（除雪および緊急時は除く）

連絡先：現場代理人 渡邊 淳

事務所：018-823-7281



コメント

現在、ガスタービン発電機の製作が完了し、残り設備の製作をしております。

なお、現場の作業は、建設工事と調整しながらの実施を予定しております。

護岸工事：

伊藤工業 株式会社

工期：令和7年4月1日～令和8年3月19日

冬期休暇 12月27日～1月4日

（除雪および緊急時は除く）

連絡先：現場代理人 大友 朝陽

事務所：018-886-2135

コメント

2月から施工開始を予定しております。

ご不明な点がございましたら連絡をお願いします。

