

# 古川雨水排水ポンプ場工事だより



発注者：秋田市上下水道局 担当：下水道整備課 下水道整備第二係 018-864-1455

令和8年4月号



## 各工事の進捗状況 及び お知らせ

※工事を急ピッチで進めているため、祝日、日曜日の作業について何卒ご理解願います。

建設工事：引込施設・ポンプ場（基礎・躯体）・吐出水槽・乗り越し管

熊谷・山岡・秋田舗道建設工事共同企業体

工期：令和6年1月29日～令和9年3月24日

連絡先：現場代理人 松本 佳人


事務所：018-838-5493

ポンプ棟/ポンプ井・水路 スクリーン棟/着水槽・スクリーン水路・沈砂池躯体構築



ポンプ井方向  
地下1階床  
鉄筋工事中  
一部コンク  
リート打設済

スクリーン室  
方向地下1階床  
鉄筋工事中

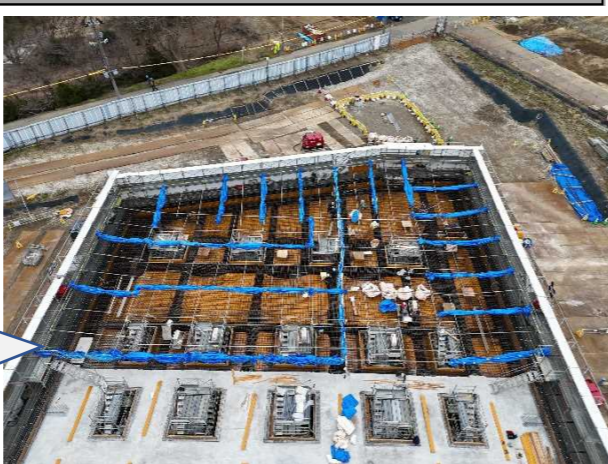

ポンプ場は、底版上からの柱・壁及び地下1階の床躯体コンクリート工事を進めていきます。4月はコンクリートを打設する日が1回あります。引込施設では、接続水路が完成しましたので、上部躯体工事を施工します。ポンプ場でのコンクリート打設日は特に、コンクリートの搬入車両が多くなりますので、ポンプ場入口前の電光掲示板でもご案内致します。引続き工事車両の出入り等により、ご迷惑をおかけしますがご協力の程よろしくお願い致します。

引込施設  
接続水路

接続水路  
上部工  
準備工事



公共下水道築造工事：導水渠

山岡・加賀屋・石黒建設特定建設工事共同企業体

工期：令和6年1月12日～令和8年3月23日



連絡先：現場代理人 高橋 浩樹

事務所：018-826-1616



コメント

導水渠工事は無事に終了しました。令和6年からの長い間、近隣住民の皆様からのご協力に感謝いたします。本当にありがとうございました。

河川敷整備工事：

秋田舗道株式会社

工期：令和7年8月29日～令和8年3月23日



連絡先：現場代理人 奈良 誠

事務所：018-862-4898



コメント

河川敷整備工事は無事に終了しました。ご協力ありがとうございました。


機械設備工事：

西島・山岡・秋田東北建設工事共同企業体

工期：令和6年3月18日～令和9年3月24日

連絡先：現場代理人 菊池 圭紘

事務所：022-223-3971



コメント

現在、排水ポンプの製作が完了し、残り設備の製作をしております。

なお、現場の作業は、建設工事と調整しながらの実施を予定しております。

電気設備工事：

本荘電気・松澤電気・ライトン

特定建設工事共同企業体

工期：令和6年6月7日～令和9年3月24日

連絡先：現場代理人 渡邊 淳

事務所：018-823-7281



コメント

現在、ガスタービン発電機の製作が完了し、残り設備の製作をしております。

なお、現場の作業は、建設工事と調整しながらの実施を予定しております。

護岸工事：

伊藤工業 株式会社

工期：令和7年4月1日～令和8年9月14日

連絡先：現場代理人 大友 朝陽

事務所：018-886-2135



コメント

今月は先月に引き続き、左岸側で河川護岸ブロックの設置を行います。
