



古川雨水排水ポンプ場工事だより



発注者：秋田市上下水道局 担当：下水道整備課 下水道整備第二係 018-864-1455

令和8年4月号



各工事の進捗状況 及び お知らせ

※工事を急ピッチで進めているため、祝日、日曜日の作業について何卒ご理解願います。

建設工事：引込施設・ポンプ場（基礎・躯体）・吐出水槽・乗り越し管

熊谷・山岡・秋田舗道建設工事共同企業体


工期：令和6年1月29日～令和9年3月24日

連絡先：現場代理人 松本 佳人

事務所：018-838-5493

春期休暇 5月2日～4日（緊急時は除く）※5日・6日は作業を実施します。

ポンプ棟/ポンプ井・水路 スクリーン棟/着水槽・スクリーン水路・沈砂池躯体構築

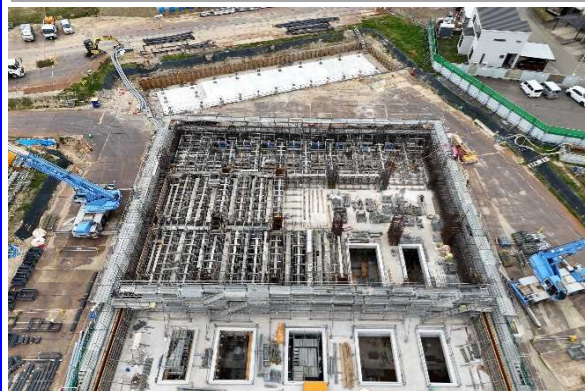

ポンプ井方向
1階床
型枠工事中



スクリーン室
方向地下1階壁
型枠工事中



ポンプ場は、地下1階の柱・壁及び1階の床躯体コンクリート工事を進めます。5月後半に、コンクリートを大量に打設する日が2回あります。吐出水槽の基礎工事が始まりました。引込施設は、上部躯体のコンクリート工事が完成します。ポンプ場でのコンクリート打設日は特に、コンクリートの搬入車両が多くなりますので、ポンプ場入口前の電光掲示板でもご案内致します。引続き工事車両の出入り等により、ご迷惑をおかけしますがご協力の程よろしくお願い致します。

引込施設
接続水路

接続水路
上部躯体
型枠工事中




機械設備工事：

西島・山岡・秋田東北建設工事共同企業体
工期：令和6年3月18日～令和9年3月24日

春期休暇 5月1日～5月10日（緊急時は除く）

連絡先：現場代理人 水嶋 則夫
事務所：022-223-3971

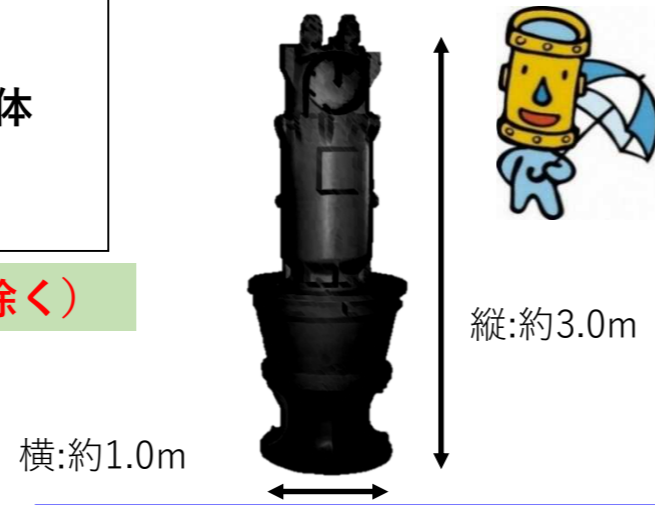

コラム型水中ポンプ主ポンプ（雨水排水）
を8台設置します。

コメント

現在、排水ポンプの製作が完了し、残り設備の製作をしております。
なお、現場の作業は、建設工事と調整しながらの実施を予定しております。

電気設備工事：


本荘電気・松澤電気・ライトン特定建設工事共同企業体
工期：令和6年6月7日～令和9年3月24日

春期休暇 4月29日～5月6日（緊急時は除く）

連絡先：現場代理人 渡邊 淳
事務所：018-823-7281

コメント

現在、ガスタービン発電機の製作が完了し、
残り設備の製作をしております。
なお、現場の作業は、建設工事と調整しながらの実施を予定しております。



【ガスタービン発電装置製作完了】

護岸工事：

伊藤工業 株式会社
工期：令和7年4月1日～令和8年9月14日

春期休暇 5月2日～5月6日（緊急時は除く）

連絡先：現場代理人 大友 朝陽
事務所：018-886-2135

コメント

現在、左岸（現場事務所側）で河川護岸ブロックの設置を行って
おりますが、5月から右岸（道路側）で作業を行います。

