




古川雨水排水ポンプ場工事だより



発注者：秋田市上下水道局 担当：下水道整備課 下水道整備第二係 018-864-1455

令和8年6月号




各工事の進捗状況 及び お知らせ

※工事を急ピッチで進めているため、祝日、日曜日の作業について何卒ご理解願います。


建設工事：引込施設・ポンプ場（基礎・躯体）・吐出水槽・乗り越し管
熊谷・山岡・秋田舗道建設工事共同企業体
工期：令和6年1月29日～令和9年3月24日
連絡先：現場代理人 松本 佳人
事務所：018-838-5493

ポンプ棟/地下1階配管室構築 スクリーン棟/スクリーン室完成 吐出水槽/底版構築

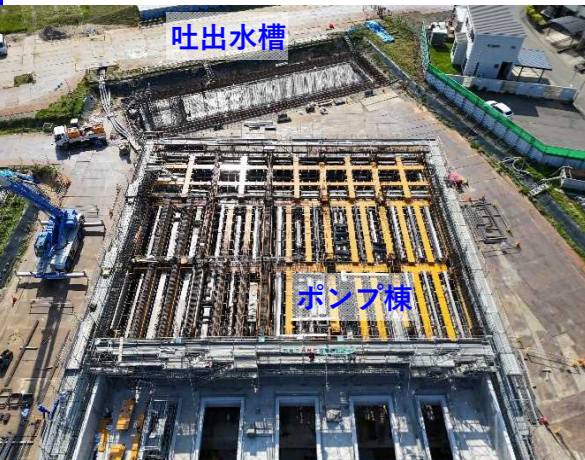

ポンプ井方向
1階床 鉄筋
型枠工事中

スクリーン室
方向 地下2階
脱型・仕上げ

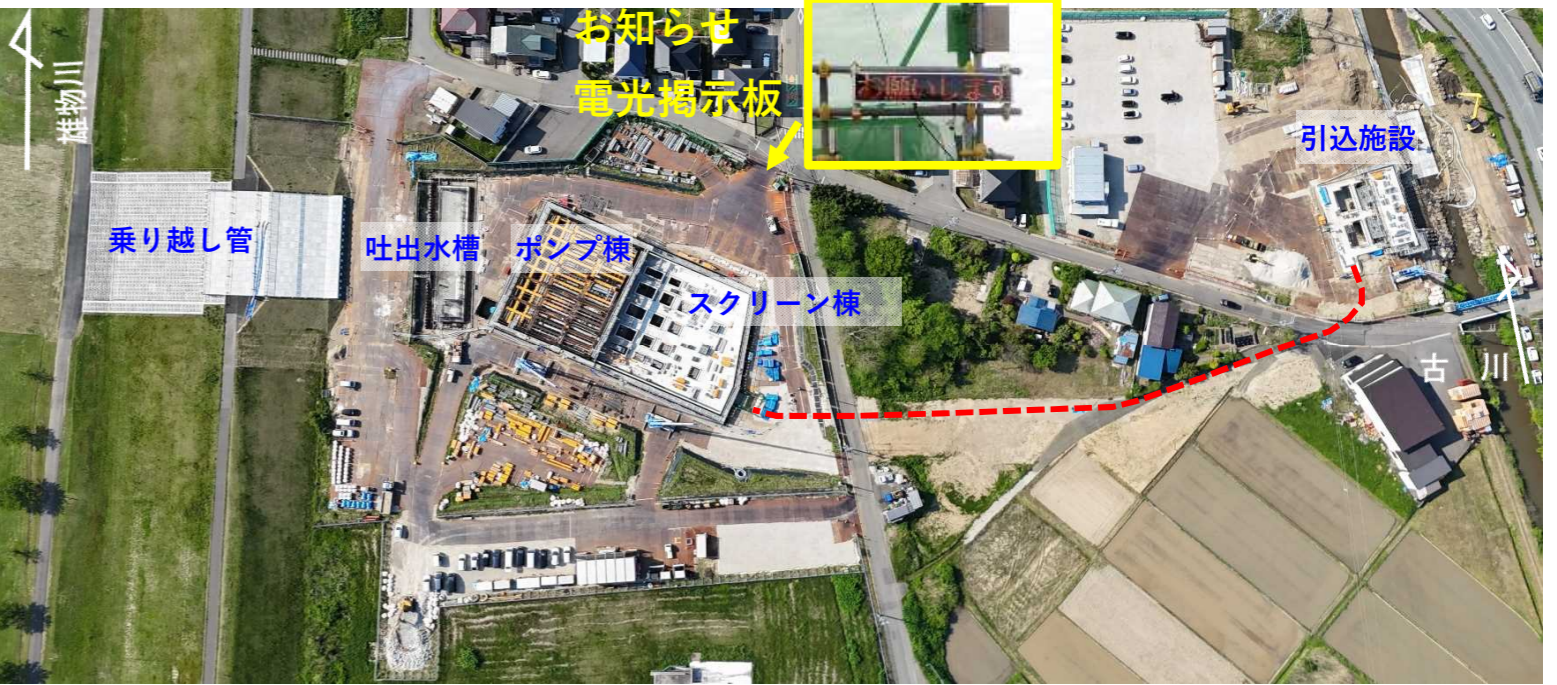

ポンプ場は、地下1階の柱・壁及び1階の床の躯体コンクリート工事を進めます。6月は、コンクリートを大量に打設する日が4回あります。吐出水槽は底版を終え、上部躯体工事を進めます。引込施設は、上部躯体の型枠を脱型し、階段を作ります。ポンプ場でのコンクリート打設日は特に、コンクリートの搬入車両が多くなりますので、ポンプ場入口前の電光掲示板でもご案内致します。引続き工事車両の出入り等により、ご迷惑をおかけしますがご協力の程よろしくお願い致します。

引込施設
接続水路


接続水路
上部躯体
脱型・仕上げ



機械設備工事：

西島・山岡・秋田東北建設工事共同企業体
工期：令和6年3月18日～令和9年3月24日

連絡先：現場代理人 水嶋 則夫
事務所：022-223-3971

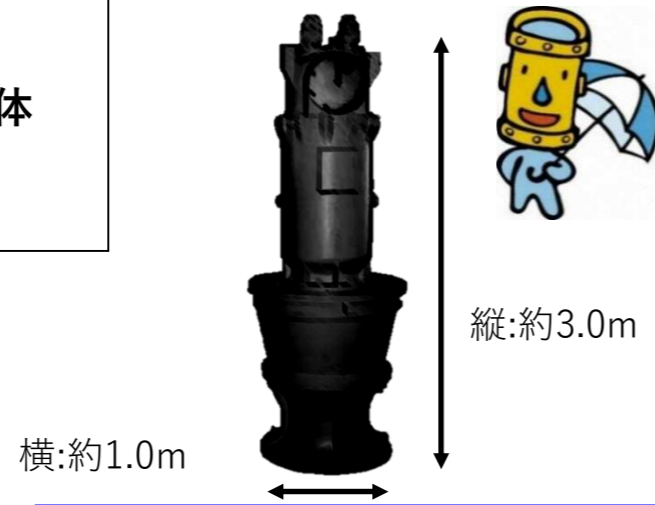

コラム型水中ポンプ主ポンプ（雨水排水）
を8台設置します。

コメント

現在、排水ポンプの製作が完了し、残り設備の製作をしております。
なお、7月から現場作業を開始します。

電気設備工事：

本荘電気・松澤電気・ライトン特定建設工事共同企業体
工期：令和6年6月7日～令和9年3月24日

連絡先：現場代理人 渡邊 淳
事務所：018-823-7281

コメント

現在、ガスタービン発電機の製作が完了し、
残り設備の製作をしております。
なお、7月から現場作業を開始します。



【発電機盤製作完了】

護岸工事：

伊藤工業 株式会社
工期：令和7年4月1日～令和8年9月14日

連絡先：現場代理人 大友 朝陽
事務所：018-886-2135

コメント

現在、右岸（道路側）で河川護岸ブロックの設置を行っております。
6月から他工事との調整をしながら両岸で作業を行います。

