

秋田市立日新小学校改築計画の概要

1. 事業の目的

昭和47年に建築した日新小学校は築48年が経過しており、校舎等および校内設備の老朽化が著しいものの、敷地が狭いことから、これまで学校運営を継続しながらの大規模改造工事を実施することができなかったため、敷地を拡張し仮設校舎を不要とする改築を行うものである。

2. 全体計画

令和3年度 基本・実施設計委託
 令和4年度 造成工事、増築校舎・プール解体工事、木材調達
 令和5～6年度 校舎および屋体新築工事、備品等購入
 令和7年度 既存校舎等解体工事
 令和8年度 外構整備工事

3. 敷地概要

所在地 秋田市新屋栗田町24番1号
 敷地面積 約16,000㎡
 用途地域の指定 第一種中高層住居専用地域 / 第22条指定区域
 建蔽率/容積率 60% / 200%

4. 計画施設概要

(1) 構造・規模

校舎棟 木造3階建て 6,790㎡以上7,000㎡以内
 屋体棟 木造もしくは他構造（木質仕上）1～2階建て 1,552㎡以上1,600㎡以内
 給食棟 構造不問（校舎棟等との外観の統一を図る。上記2棟と複合可）150㎡以上350㎡以内
 その他 グラウンド7,200㎡以上（100m直線トラック）、バス回転地

(2) 必要諸室

普通教室（30）、学習室（6）、特別教室（12）、多目的スペース、管理諸室、昇降口、トイレ、給食調理室、機械室、屋内運動場（アリーナ、ステージ、放送室、更衣室、用具庫、トイレ）

(3) 事業費

30億円を超えないものとする。（校舎・屋体・給食棟の建設費（杭工事を含む）のみ）
 基本・実施設計委託業務の概算予定価格の上限は、113,000千円（税込）とする。なお、算定にあたっては秋田県設計業務委託算定基準を適用する。


5. 既存校舎概要

校舎棟 鉄筋コンクリート造4階建て 6,273㎡（増築校舎棟と給食室を含む）
 屋体棟 鉄骨造平家建て 836㎡
 その他 グラウンド6,719㎡、プール25m×10m

6. 児童・学級数推移

令和2年5月1日現在

年度	1年		2年		3年		4年		5年		6年		合計	
	児童数	学級数	児童数	学級数	児童数	学級数	児童数	学級数	児童数	学級数	児童数	学級数	児童数	学級数
3	120	4	136	5	139	5	132	5	131	5	134	5	798	29
4	111	4	120	4	136	5	139	5	132	5	131	5	771	28
5	93	3	111	4	120	4	136	5	139	5	132	5	733	26
6	90	3	93	3	111	4	120	4	136	5	139	5	690	24
7	101	4	90	3	93	3	111	4	120	4	136	5	651	23
8	75	3	101	4	90	3	93	3	111	4	120	4	590	21

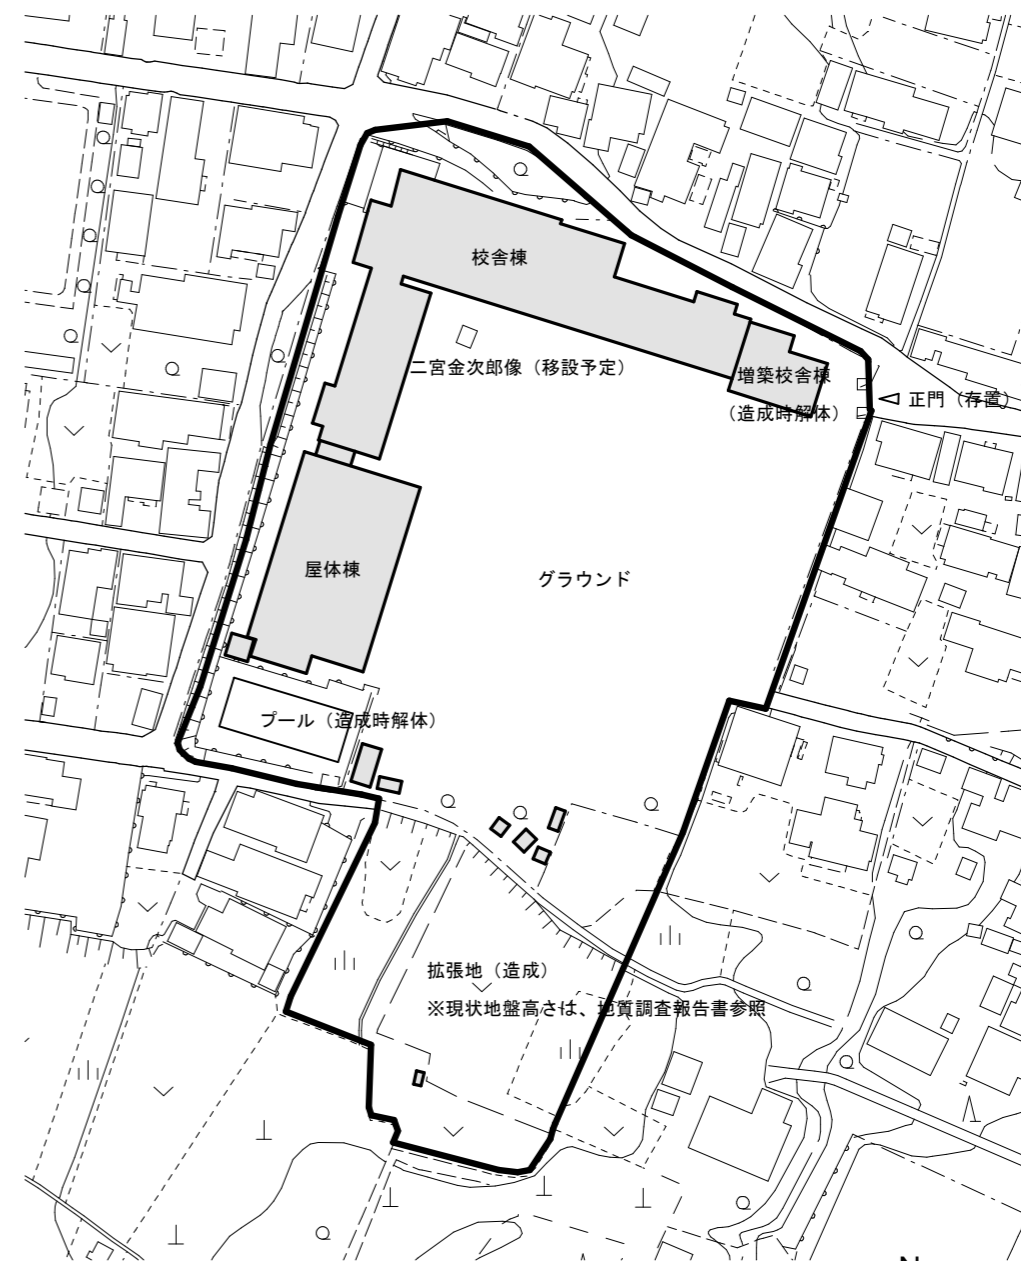

現状図 S=1/1,500
