

古川流域の総合的な治水対策事業に係る 国土交通省の関連事業について

令和8年6月20日

国土交通省 東北地方整備局

秋田河川国道事務所

【雄物川】 秋田地区河川防災ステーションの整備について

- 雄物川下流域では、平成29年7月、平成30年5月洪水で家屋等の浸水被害が発生しています。
- 秋田地区河川防災ステーションは、雄物川下流域の洪水被害を最小限とするため、災害時の緊急復旧活動を行う上で必要な緊急用資材の備蓄、ヘリポート等の整備を行うとともに、緊急車両基地や秋田市が水防センターを設置するなど、災害時の活動拠点としての利活用するなど計画しています。
(令和4年3月25日 河川防災ステーション整備計画が登録)



| | | |
|-------|---|--------------------------------------|
| 令和4年度 | : | 河川防災ステーションの詳細設計及び用地調査を実施 |
| 令和5年度 | : | 用地協議・用地取得を実施 |
| 令和6年度 | : | 基盤盛土 |
| 令和7年度 | : | 基盤盛土／車両格納庫（国）／水防センター（秋田市）【完成】 |
| 令和8年度 | : | 車両格納庫（国）／備蓄資材整備（根固めブロック・連結ブロック・土砂 等） |

【事業完成予定】

河川防災ステーションの役割

- 洪水時に河川管理者が行う災害復旧活動の拠点として整備するもので、大半は市町村が行う水防活動の拠点(水防センター)を併設しています。
- 土砂やブロックなどの緊急用資材を備蓄しておくほか、ヘリポートや災害対策車両の待機場所なども確保しています。
- 平常時には地域の人々のレクリエーションの場として、また河川を中心とした文化活動の拠点として大いに活用が期待される施設です。

<災害時>

- 被災箇所の復旧工事のための材料備蓄
- 排水ポンプ車など災害対策車両、防災ヘリの拠点
- 水防活動の拠点(水防団)


<平常時>

- 地域のコミュニティスペースとして活用
- 水防活動の訓練などに利用
- 防災学習の場や川の情報発信拠点



秋田地区河川防災ステーション(進捗状況)

- 秋田地区河川防災ステーションの整備については、古川流域で進められている関係機関による事業と連携を図りながら計画的に進め、一体的に整備を進めて参ります。
- 令和8年度の完成に向け整備の推進を図ってます

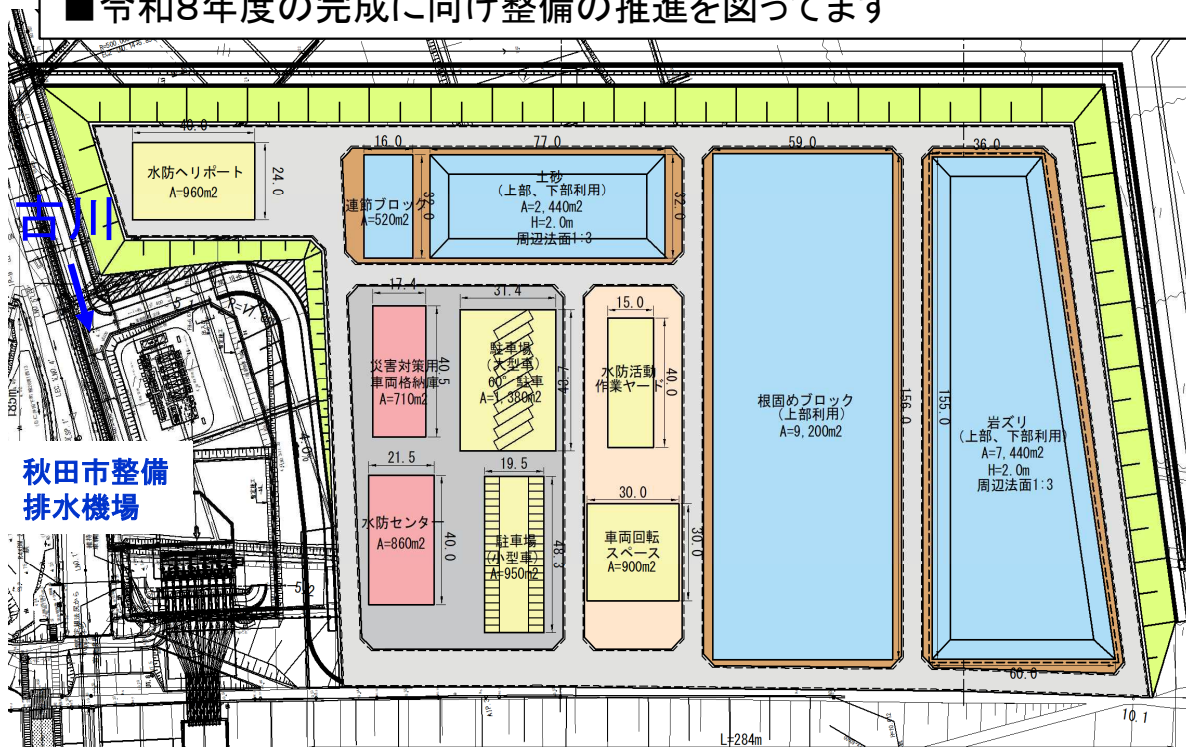

全体面積：約 56,000m²
全体土量：約 290,000m³

秋田市整備
排水機場

雄物川

水防センター(秋田市)
【完成】




車両格納庫(国)
【R8.6末完成予定】



雄物川の河川改修(河道掘削)【令和6年度完了】

- 令和5年7月15日～16日の豪雨により雄物川の水位が上昇し、家屋浸水等の浸水被害が発生。雄物川の河道掘削を緊急的に行い洪水時の水位を低下させ、地域住民の安全・安心を確保。
- 河川より掘り出された土砂は、周辺事業で有効活用。
(秋田地区河川防災ステーション整備の盛土材料に活用しました)

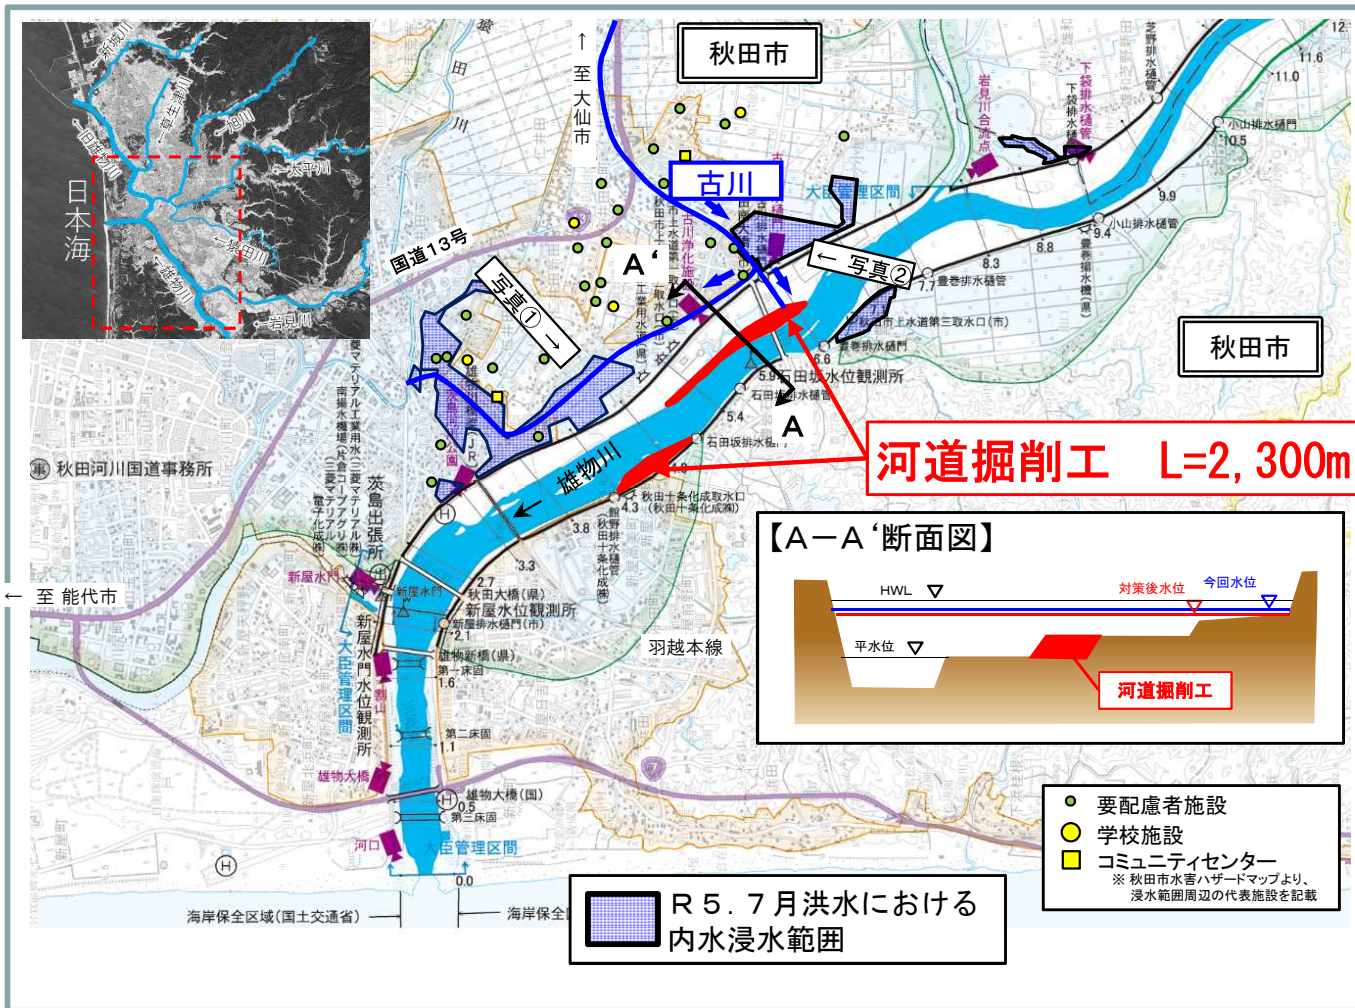

- 事業内容: 河道掘削
- 事業期間: 令和5年度
- 事業費 : 13.3億円
(防災・減災対策等強化事業推進費)

雄物川右岸(秋田南大橋付近)河道掘削状況写真

