

令和5年11月定例会

予算決算委員会資料

(建設部)

公共土木施設災害復旧事業について

7月14日からの記録的豪雨により被災した公共土木施設（道路・河川・公園）について、施設を復旧し、安全確保を図るもの。

補正額 372,000千円

1 補正額内訳

(1) 道路 9路線 337,000千円

(単位:千円)

被災箇所	被災概要	復旧概要	事業費(工事費)
市道広域河辺北野田神内線	ボックスカルバート崩壊	ボックスカルバート復旧、市道復旧	36,000
市道矢坂1号線	市道崩落および護岸崩壊	コンクリートブロック積工、市道復旧、陥没復旧	55,500
市道上新城中家ノ後線	市道崩落および護岸崩壊	コンクリートブロック積工、市道復旧、表層工等	10,500
市道岨谷峡線	市道崩落および護岸崩壊	コンクリートブロック積工、市道復旧、表層工等	40,000
市道仙翁台線	市道崩落および護岸崩壊	コンクリートブロック積工、市道復旧、護岸擦り付け工	24,000
市道神内大又2号線	市道崩落および護岸崩壊	コンクリートブロック積工、平張ブロック積工、市道復旧等	110,000
市道小又2号線	市道崩落および護岸崩壊	コンクリートブロック積工、市道復旧	45,000
市道仁別2号線ほか1路線	護岸崩壊	コンクリートブロック積工、防護柵工	16,000
合計	—	—	337,000

(2) 河川 1河川 20,000千円

(単位:千円)

被災箇所	被災概要	復旧概要	事業費(工事費)
普通河川 仁別川	護岸崩落	コンクリートブロック積工	20,000

(3) 公園 1公園 15,000千円

(単位:千円)

被災箇所	被災概要	復旧概要	事業費(工事費)
雄物川河川緑地(野球場)	表土洗掘流出	グラウンド舗装工	15,000

2 主な被災状況

(1) 道路

市道広域河辺北野田神内線
ボックスカルバート崩壊



市道矢坂1号線
市道崩落および護岸崩壊



(2) 河川

普通河川仁別川
土羽護岸洗掘



(3) 公園

雄物川河川緑地（野球場）
表土洗掘流出



都市計画道路泉外旭川線の債務負担行為設定について

1 現在のJR東日本との全体協定概要（JRアンダー部分の工事）

- ・協定締結期間 令和2年度から令和7年度（令和8年3月31日まで）
- ・全体協定額 5,879,940千円

2 期間延長および増額の理由

- ・施工期間の延長・・・JRとの協議の結果、令和12年度まで延長
- ・事業計画の見直し・・・RC函体工および内装工をJR施工に変更（約13億円増）
- ・工事費の増額・・・労務単価・資材価格の上昇、リース料金の増（約9億円増）

3 年度別事業費

（単位：円）

年度	①R7までの見込額 債務負担設定済額 5,880,000千円(R元～R7)	②R8以降の見込額 （今回債務負担行為設定額） 4,130,302千円(R5～R12)	備考
R元	0	-	
R2	59,883,137	-	精算済
R3	653,931,219	-	精算済
R4	916,192,649	-	精算済
R5	828,125,100	0	発進・到達立坑仮設
R6	652,894,000	0	発進・到達立坑仮設、函体推進工
R7	835,319,255	0	函体推進工
R8	-	965,514,000	函体推進工
R9	-	1,036,024,000	函体推進工
R10	-	823,399,914	函体推進工
R11	-	696,742,200	内装工
R12	-	608,620,926	RC函体工
合計	3,946,345,360	4,130,301,040	

- ・現在全体協定額（R2～R7）5,879,940千円
- ・R7までの見込額 3,946,345千円・・・①
- ・R8～R12見込額 4,130,302千円・・・②今回債務負担行為設定額

4 変更後のJR東日本との全体協定概要


- ・協定締結期間 令和2年度から令和12年度（令和13年3月31日まで）
 - ・全体協定額 8,076,647千円・・・①+②
- ※現在協定額との差額の2,196,707千円が増額となる。

5 今後のスケジュール

		現協定期限 ↓							事業認可期間 ↓				
		R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度
都市計画事業認可変更（R5.9～11月）													
債務負担行為設定（R5.11月議会）													
JR施工 変更協定締結（R6.2月議会）													
JR 施 工	線路敷地下 函体工事（アンダー）												
市 施 工	道路築造工事（アプローチ）												

凡例	現在：全体協定締結時の計画
	変更：事業認可変更、変更協定締結 計画


平面図

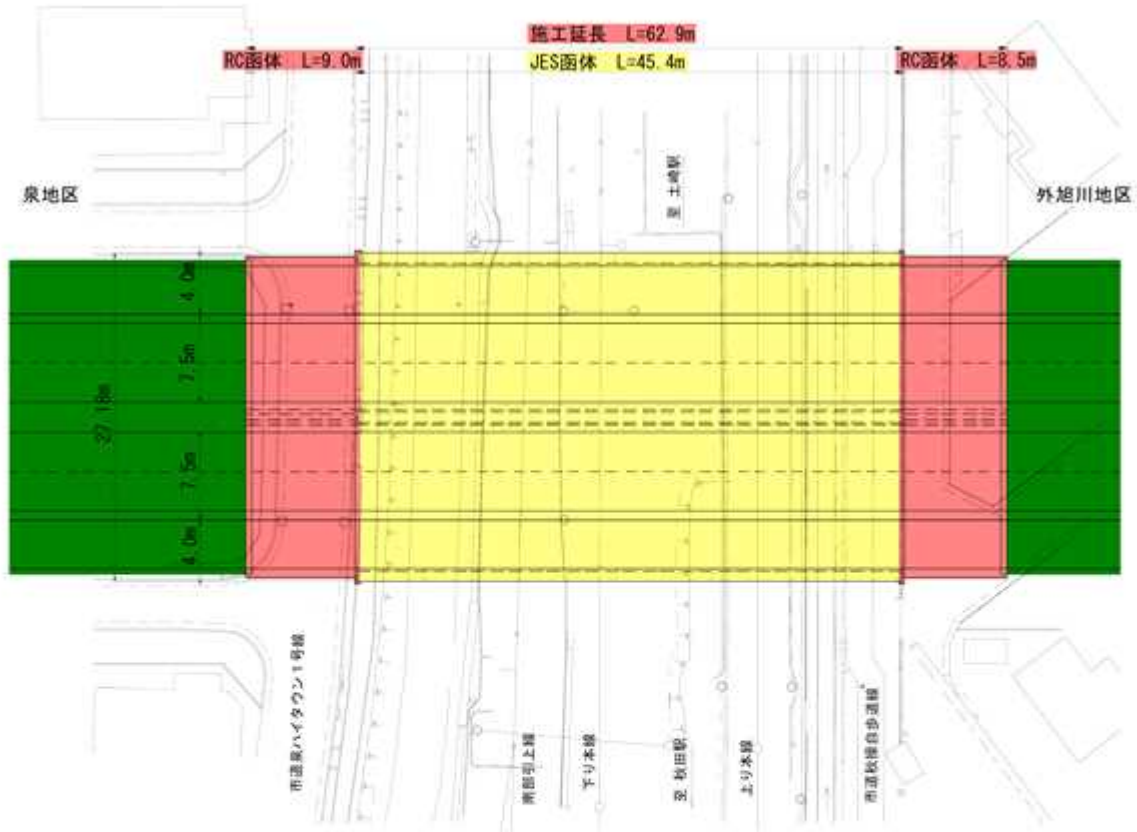

側面図



函体断面図

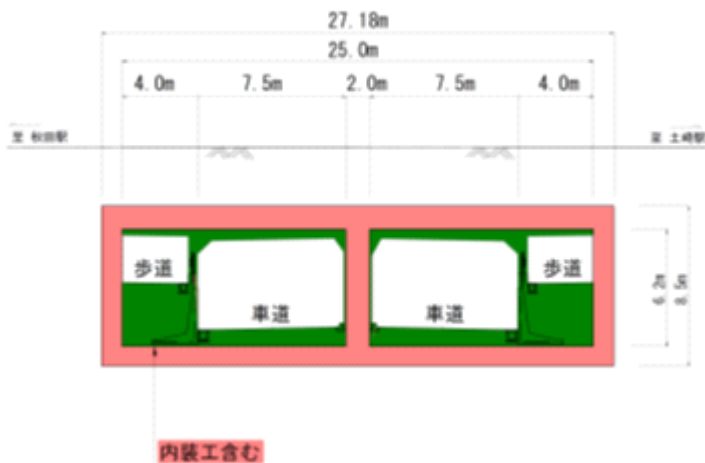

凡例	
秋田市施工	■
JR施工 (変更前)	■
JR施工 (変更後追加)	■

令和5年11月補正予算整備計画箇所表

1 河川環境整備事業

地区名

飯島

1 水路（道路建設課）

種別

法定外公共物水路

2 公共土木施設災害復旧事業

地区名

上新城

上新城

添川

仁別

河辺

河辺

河辺

河辺

仁別

仁井田

9 路線（道路維持課）

1 河川（道路建設課）

1 公園（公園課）

路線・河川・公園名

上新城中家ノ後線

小又2号線

矢坂1号線

仁別2号線ほか1路線

広域河辺北野田神内線

岨谷峡線

仙翁台線

神内大又2号線

普通河川仁別川

雄物川河川緑地（野球場）

○債務負担行為設定

1 道路改良事業

地	区	名
---	---	---

飯	島
東	通
	泉
浜	田

2 道路維持修繕事業

地	区	名
---	---	---

金	足
飯	島
土	崎
桜	台
卸	町
雄	和
河	辺

3 消融雪施設整備事業

地	区	名
---	---	---

広	面
千	秋

4 側溝改良事業

地	区	名
---	---	---

外	旭	川
将	軍	野
新		屋
河		辺
雄		和

5 路線（道路建設課）

路	線	名
---	---	---

飯島小学校線ほか1路線
川尻広面線
泉一ノ坪26号線
浜田滝ノ元7号線

7 路線（道路維持課）

路	線	名
---	---	---

小泉追分線
東上谷地大袋線
土崎保戸野線
桜台3号線
卸団地7号線
本田妙法線
和田本町線

2 路線（道路維持課）

路	線	名
---	---	---

広面1号線
千秋公園矢留町線

7 路線（道路維持課）

路	線	名
---	---	---

外旭川八幡田28号線ほか2路線
通穴線
田尻沢西町1号線
畑谷線
女米木戸賀沢線

5 橋りょう修繕事業

地 区 名

金 足

牛 島

上 北 手

河 辺

4 橋 (道路維持課)

橋りょう名

福田三号橋

牛島西歩道橋

荒巻三号橋

渡ノ波橋

6 都市公園バリアフリー化事業

地 区 名

檜 山

1 公園 (公園課)

公 園 名

檜山登町街区公園
